



**T.C.  
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ**

---

**2024 YILI  
YATIRIM PROGRAMI  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
RAPORU**

---

**MART 2025**



# GENEL DEĞERLENDİRME

## Misyon ve Vizyon

### Akdeniz Üniversitesi'nin Misyonu:

Güçlü araştırma alt yapımız ve alanında etkin ve yetkin akademik personelimiz ile

- Araştırma alanında uluslararası alanda tercih edilen, ülkede örnek, bölgede lider olmak,
- Girişimcilik alanında sektörde işbirlikçi ve öncü olmak,
- Eğitim alanında topluma araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı bireyler kazandırmak,
- Toplumsal katkı alanında sürdürülebilir projeler ile topluma ve insanlığa hizmet vermek,
- Uluslararası işbirlikli projeler, nitelikli yayınlar, ikili anlaşmalar yaparak ülkemizi ve üniversitemizin akademik alanda tanınırlığını arttırmaktır.

### Akdeniz Üniversitesi'nin Vizyonu:

- Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojiye öncü, araştırma odaklı, yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren araştırma üniversitesi olmaktır.

## Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

### Stratejik Amaç 1- Araştırma Faaliyetlerini İyileştirmek

- Hedef 1.1** Araştırma Geliştirme Altyapı ve Kapasitesinin İyileştirilmesi
- Hedef 1.2** Disiplinlerarası Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi
- Hedef 1.3** Üniversite-Sektör Ar-Ge ve Yenilik Kaynaklı İşbirliğini Artırmak
- Hedef 1.4** Nitelikli Araştırma Çıktılarının Artırılması

### Stratejik Amaç 2- Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak

- Hedef 2.1** Nitelikli Girişim Sayısını Artırmak, Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Ekonomik Etkilerini Büyütmek
- Hedef 2.2** Üniversite Teknoloji Portföyünün Geliştirilmesi ve Ticarileştirilmesi
- Hedef 2.3** Üniversite Endüstri Etkileşimini ve Katma Değeri Yüksek Proje Sayısını Artırmak

### Stratejik Amaç 3- Eğitim Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek

- Hedef 3.1** Lisans ve Lisansüstü Eğitimin Niteliğini Artırmak
- Hedef 3.2** Eğitimcilerin Eğitimi Çalışmalarını Artırmak
- Hedef 3.3** Program Bilgi Paketlilerinin Kurumun Web Sayfasından İzlenebilir Hale Getirilmesi
- Hedef 3.4** Kütüphanede Kaynaklarının Artırılması, Mevcut Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılması
- Hedef 3.5** Öğrencilere Sunulan Hizmetleri ve Hizmet Kalitesini Artırmak

### Stratejik Amaç 4- Toplumsal Katkısı Artırmak

- Hedef 4.1** Sosyal Sorumluluk Projelerini Artırmak
- Hedef 4.2** Sağlıklı Yaşam İçin Kaliteli Sağlık Uygulamaları Çalışmalarını Artırmak
- Hedef 4.3** Hayat Boyu Öğrenmeye Katkı Sağlamak
- Hedef 4.4** Mezunlarla Etkileşimin Arttırılması

### Stratejik Amaç 5- Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi

- Hedef 5.1** Uluslararasılaşma Kapasitesinin Arttırılması
- Hedef 5.2** Kalite Güvence Sistemlerinin Üniversite Genelinde Yaygınlaştırılması ve Yönetim Kalitesinin Geliştirilmesi
- Hedef 5.3** İnsan Kaynaklarını Artırılması, Mevcut İnsan Kaynaklarının Niteliğinin Artırılarak Etkin ve Verimli Kullanılması
- Hedef 5.4** Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
- Hedef 5.5** Altyapı ve Fiziksel Alanların Geliştirilmesi

## YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı özel bütçeli idareler cetvelinin A bendinde Yüksek Öğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan özel bütçeli bir kurumdur. Gelirlerimiz ise;

### A- Özel Bütçe

- a. Hazine Yardımı
- b. Öz Gelirler

### B- Döner Sermaye

### C- Bütçe Dışı Kaynak

- a. TÜBİTAK
- b. AB
- c. Şartlı Bağış ve Yardımlar
- d. Bağış ve Yardımlar
- e. Farabi
- f. Mevlana

# AKDENİZ ÜNİVERSİTESİNİN MEVCUT ÜRETİM/ HİZMET KAPASİTESİ

## FİZİKSEL YAPI:

Üniversitemizin ana yerleşkesi Dumlupınar Bulvarı – Uncalı semti arasında yer alan bölgede kurulmuştur. Çallı mevkilerinde de küçük yerleşkesi bulunmaktadır. **Merkez yerleşke 3.399.409,75 m<sup>2</sup> arazi yüzölçümü ve 825.902 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir.**

**24 adet Fakülte** (Diş Hekimliği, Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, Kemer Denizcilik, Kumluca Sağlık Bilimleri, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler, Manavgat Turizm, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Serik İşletme, Spor Bilimleri, Su Ürünleri, Tıp, Turizm, Uygulamalı Bilimler, Ziraat), **2 adet Yüksekokul** (Yabancı Diller, Devlet Konservatuvarı), **12 adet Meslek Yüksekokulu** (Adalet, Demre Dr.Hasan Ünal, Elmalı, Finike, Göynük Mutfak Sanatları, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Sağlık Hizmetleri, Serik Gülsün Süleyman Süral, Sosyal Bilimler, Teknik Meslek Yüksekokulu) bulunmaktadır. Tüm yerleşkelerin toplamında 948.325 m<sup>2</sup> kapalı alan bulunmaktadır.

**Akdeniz Üniversitesi Hastanesi toplam 203.547 m<sup>2</sup>'lik** hizmet alanına sahiptir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Ruh Sağlığı Tanı ve Tedavi Merkezi de Merkez Yerleşke alanı içerisinde yer almaktadır. 2024 yılında ihalesi yapılan 800 yataklı hastane inşaatı tamamlandığında Üniversite hastanesi toplam metrekaresi 304.497 m<sup>2</sup>'ye yükselecektir.

Ayrıca Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Kapalı Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Atletizm Pisti, Olbia Kültür merkezi, Yakut Yeni Yaşam Alanı, CeyPark, Sosyal Tesisler, Rektörlük Binası, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Merkezi ısı santral binası da merkez yerleşke içerisinde yer almaktadır.

Şehir merkezinde yer alan bu yerleşkeler dışında Üniversitemize bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu, Üniversitemizin 19 ayrı yerleşim alanı daha bulunmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde hastane, fakülte binaları, laboratuvarlar, kütüphane ve spor tesisleri yer almaktadır. Üniversite merkez yerleşkesi **3.399.409,75 m<sup>2</sup>** alandan oluşmaktadır. Projelendirilmiş örtülü alan büyüklüğü ise **1.117.253 m<sup>2</sup>**'dir.

# GENEL BİLGİLER

## A.Ü. Taşınmazların Dağılımı

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )	Açıklama
	Üniversite	Maliye / Hazine	Diğer		
Kampüs*	3.347.416,07	51.993,68		3.399.409,75	İmar Planına göre m <sup>2</sup> durumu
Konyaaltı, Arapsuyu Mah. (Kampüs dışı)	13.849,27			13.849,27	
Kepez, Kültür Mah.	3.136,63			3.136,63	
Muratpaşa, Bayındır Mah.	6.494,00			28.351,00	
Sosyal Bilimler M.Y.O. (Çallı)	21.857,00				
Alanya, Telatiye mah.	9.995,11			9.995,11	
Döşemealtı, Altinkale Mah. (Eski Ayşe Sak M.Y.O.)	3.881,00	2.644,00	417,00	6.942,00	Yeşilbayır Belediyesi
Aksu, Çalkaya Mah. Ziraat Fak.Araş. ve Uyg. Çiftliği		24.999,97		1.083.584,53	
		643.425,41			
		415.159,15			
Serik, Merkez Mah. Gülsün-Süleyman Süral M.Y.O	28.559,33			28.559,33	
Serik, Kökez Mah. İşletme Fakültesi *			6.102,87	6.102,87	Serik Belediyesi
Elmalı, Karyağdı Mah. Elmalı M.Y.O. Kampüsü		199.796,93		199.796,93	
Elmalı, Gündoğan Mah.	2.412,00			3.343,10	
	931,10				
Kumluca, Bağlık Mah. Kumluca Sağlık Bilimleri Fak. ve M.Y.O. Kampüsü		39.984,17		39.984,17	
Korkuteli, Alaaddin Mah.		194.202,95		194.202,95	
Korkuteli, Uzunoluk Mah. Korkuteli M.Y.O. Kampüsü		74.410,92		74.410,92	
Korkuteli, Yeşiloba Köyü		1.034.586,38		1.034.586,38	
Manavgat, Emek Mah. Manavgat M.Y.O. Kampüsü ve spor kompleksi		17.940,00		17.940,00	
Manavgat, Çeltikçi Mah. Manavgat MATSO Turizm Fakültesi ve Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kampüsü		53.606,00		53.606,00	
Manavgat, Emek Mah. ve Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kampüsü		30.329,00		30.329,00	
Manavgat, Ilıcalar Mah.		12.792,00		12.792,00	
Finike, İskele Mah. Finike M.Y.O. Kampüsü	26.695,19			26.695,19	
Finike, Gökbük Mah.			2.888,96	2.888,96	Finike Belediye
Konyaaltı, Doyran Mah. Antalya Saklıkent Kayak Merkezi Spor Alanı		79.685,56		79.685,56	
Kumluca, Çavuşköy Mah. Adrasan*		9.421,29		9.421,29	
Kemer, Göynük Mah. Göynük Mutfak Sanatları MYO		3.415,00		3.415,00	
Demre, Zümrütkaş Köyü Dr. Hasan ÜNAL M.Y.O		32.335,60	21.095,16 5.844,95	59.275,71	Demre Belediyesi
Kemer, Merkez Mah. Denizcilik Fakültesi		5.238,00		5.238,00	
Kemer, Kemer Mah. Sualtı Araştırmaları			1.000,00	1.000,00	Kemer Belediyesi
Muratpaşa, Haşimişcan Mah. (Eski Merkez Bankası binası)	443,00			1.066,00	
	623,00				
Muratpaşa, Kışla Mah. Mesken arsa payı	34,39			34,39	7 nolu b.bölüm
Muratpaşa, Kızıltoprak Mah. Sağlıkkocağı arsa payı	11,76			11,76	27 nolu bölüm
<b>Toplam</b>	<b>3.466.338,85</b>	<b>2.925.966,01</b>	<b>37.348,94</b>	<b>6.429.653,80</b>	

\* 1/1000 lik İmar Planına göre (Konyaaltı İlçesi Belediyesinin 02/01/2019 gün ve 5 sayılı Belediye Meclis Kararı) 18/08/2020 tarihli 3402 S.Y.Kadastro Kanunu Ek 1 sonrası

\* Adrasan'da imar çalışmaları devam etmektedir.

\* Serik Kökez'de binada belirli bir bölüm verildi.

## A.Ü. Kapalı Alanların Dağılımı

Yerleşke Adı	Kapalı Alan Miktarı (m <sup>2</sup> )		Toplam (m <sup>2</sup> )
	Üniversite	Tahsis	
Merkez Yerleşkesi	825.902		825.902
Merkez Çallı Yerleşkesi	6.636		6.636
Muratpaşa Kışla Mah. Mesken arsa payı	137		137
Merkez Yeşilbayır Yerleşkesi	2620		2.968
Aksu Ziraat Fak.Uygulama		670	670
Kumluca Yerleşkesi		6.916	6.916
Kumluca Çavuşköy Adrasan		4.009	4.009
Korkuteli M.Y.O.		2.240	2.240
Serik Gülsün-Süleyman Süral M.Y.O.	18.996		18.996
Serik İşletme Fakültesi		19.582	19.582
Manavgat M.Y.O Yerleşkesi		5.887	5.887
Manavgat Turizm Fakültesi Yerleşkesi		5.922	5.922
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		18.736	18.736
Manavgat Ilıcalar Manavgat MYO Ek Bina		4.164	4.164
Elmalı Yerleşkesi		9.610	9.610
Finike Yerleşkesi	3.560		3.560
Göynük Yerleşkesi		5.150	5.150
Demre Yerleşkesi		6.910	6.910
Kemer Yerleşkesi		330	330
<b>Toplam</b>	<b>857.851</b>	<b>90.126</b>	<b>948.325</b>

## A.Ü. Örtülü Alan Büyüklükleri ve Tamamlanma Oranları

Örtülü Alan	2023	2024
Projelendirilmiş (m <sup>2</sup> )		104.850
Bitmiş (m <sup>2</sup> ) Üniversite	964.937	964.937
Tamamlanma Oranı	%100	%82
Bitmiş Tahsisli (m <sup>2</sup> )	47.466	47.466
<b>Toplam</b>	<b>1.012.403</b>	<b>1.117.253</b>

## Lojmanlar

Lojman Tipi	Lojman Sayısı	Sayısı (Adet)		Kapalı alanı (m <sup>2</sup> )
		Dolu	Boş	
1+1	2	2		2x88=176
2+1	2	2		3x110=330
2+1	30	29	1	30x116=3.480
2+1 (bodrum)	1	1		1x110=110
2+1 (bodrum)	1	1		1x110=110
<b>Toplam</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>4.206</b>



## Akdeniz Üniversitesi Hastane Alanları

Akdeniz Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Organ Nakli Hastanesi olmak üzere hastane alanlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Birim	Akdeniz Üniversitesi Hastanesi		AÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi		AÜ Organ Nakli Hastanesi	
	Sayı (Adet)	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	Sayı (Adet)	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )	Sayı (Adet)	Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )
Acil Servis	1	1.219				
Çocuk Acil	1	231				
Yoğun Bakım	5	4.699			1	545
Ameliyathaneler	19	3.572			5	1.426
Poliklinikler	45	24.677	1	34	6	2.293
Klinik	25	36.919	2	6715	5	3.048
Laboratuvar	4	3.622			4	1.201
Eczane	1	1.033	1	117	1	294
Radyoloji Alanı	1	2.502			1	980
Nükleer Tıp Alanı	2	1.020				
Sterilizasyon Alanı	1	473			2	234
Mutfak	1	2.562			1	339
Çamaşırhane	1	833				
Teknik Servis	1	16.939	1	468	1	1.639
<b>Toplam</b>	<b>107</b>	<b>100.301</b>	<b>5</b>	<b>7.334</b>	<b>27</b>	<b>11.999</b>

## Halka Açık Kültür Sanat ve Spor Alanları

Bulunduğu Yer	Adı	Türü Kültür Sanat / Spor	Kullanım Amacı	Açık/Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	A.Ü. Stadyumu Çim Saha	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	A.Ü. Stadyumu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Fitness Merkezi A-Blok	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Çadır Spor Salonu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Mavi Spor Salonu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Yüzme Havuzu	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Yüzme Havuzu Tesis	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Kapalı Kort	Spor	Spor	Kapalı
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Zeki Budak Sahası	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Basketbol-Voleybol Sahaları	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Tırmanma Duvarı	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Tenis Kortları (8 Adet)	Spor	Spor	Açık
A.Ü. Merkezi Yerleşke	Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu	Spor	Spor	Kapalı

## Merkezi Kütüphane Kaynakları

Bölümü	Kitap	Periyodik Yayın	Elektronik Yayın	Diğerleri	Toplam
Tıp	4.320	428	65.666		70.414
Fen	10.933	99	107.953		118.985
Sosyal	40.983	140	149.558		190.681
Mevzuat (Kanun Yönetmelik Vs.)	6.338		3.458.580		3.464.918
Diğerleri		766	98.990		99.756
<b>Toplam</b>	<b>62.574</b>	<b>1.433</b>	<b>3.880.747</b>		<b>3.944.754</b>

## A.Ü. 2024 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Sayıları ve Ödenek Bilgileri

Proje Türü	2023 Yılından Devreden Proje	2024 Yılı İçinde Eklenen Proje	Toplam	2024 Yılı İçinde Tamamlanan Proje	2025 Yılına Devreden Proje	Toplam Ödenek
DPT	1		1		1	55.505.900,00 ₺
BAP	284	123	407	154	253	66.906.334,24 ₺
TÜBİTAK	124	37	161	51	110	110.533.999,10 ₺
TUSEB	15	6	21	9	12	9.720.456,79 ₺
TAGEM	1		1	1		294.519,29 ₺
AFAD	1		1		1	61.600,00 ₺
A.B.	34		34	12	22	283.959,33 € 11.858,76 \$
ERASMUS	7	14	21	2	19	979.003,10 €
<b>Toplam</b>	<b>467</b>	<b>180</b>	<b>647</b>	<b>229</b>	<b>418</b>	<b>243.022.809,42 ₺</b> <b>1.262.962,43 \$</b> <b>11.858,76 €</b>

## AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMLARI

Akdeniz Üniversitesi 2024 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımları					
06 Sermaye Giderleri	KBÖ	Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Toplam Ödenek	Gerçekleşme Toplamı
06.1 Mamul Mal Alımı	78.549.000	43.450.000	3.215.000	118.784.000	97.910.501
06.3 Gayrimaddi Hak Alımları	17.000.000	1.500.000	7.285.000	11.215.000	7.003.038
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	245.000.000	800.417.000	222.680.000	829.737.000	177.963.799
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	13.000.000		2.500.000	10.500.000	2.309.567
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	135.451.000	30.000.000	14.545.100	150.905.900	93.315.764
<b>Toplam</b>	<b>489.000.000</b>	<b>882.367.000</b>	<b>250.225.100</b>	<b>1.121.141.900</b>	<b>378.502.670</b>

## 2024 YILINDA TAMAMLANAN YATIRIM PROJELERİ

### Akdeniz Üniversitesi Hastanesi K Blok Tadilat ve Onarım İşi

**Toplam Sözleşme Bedeli** : 4.947.377,36 TL


**İşe Başlama Tarihi** : 15.05.2024

**İş Bitim Tarihi** : 28.07.2024

İşe ait proje ve şartnamelerine uygun olacak şekilde yeni mahaller alçıpanel levha ile yapılarak sıva boya işleri yapılmıştır. Mevcut çatıda akan yerler tamir edilerek su geçirimsiz hale getirilmiştir. PVC kaplamaları tamir edilerek, tamir edilemeyen mahallerde yeniden yapılmıştır. Asma tavan taş yünleri kısmi olarak yenilenip, yeni yapılan bölme alçıpan duvarları üstü asma tavan taşıyıcı sistemi yapılmıştır. Mevcut seperatörlerin demontajı yapıp idarenin istediği mahale tekrar montajı yapılmıştır. Ayrıca proje ve şartnamelerine göre çelik çatı takviyeleri yapılarak çatı güçlendirilmiştir.

Makine tesisatı olarak, ısıtma soğutma için havalandırma, duvar tipi ve salon tipi klimalar yapıldı, yangın tesisatı için yangın dolapları ve hatları yapıldı, ayrıca doktor odalarına lavabolar eklenerek tuvaletler komple tekrar yapıldı.

Elektrik tesisatı olarak, ilgili odalarda seslendirme, yangın algılama, güvenlik kamera, aydınlatma, priz ve mekanik sistemler elektrik altyapı tesisatları yapıldı.

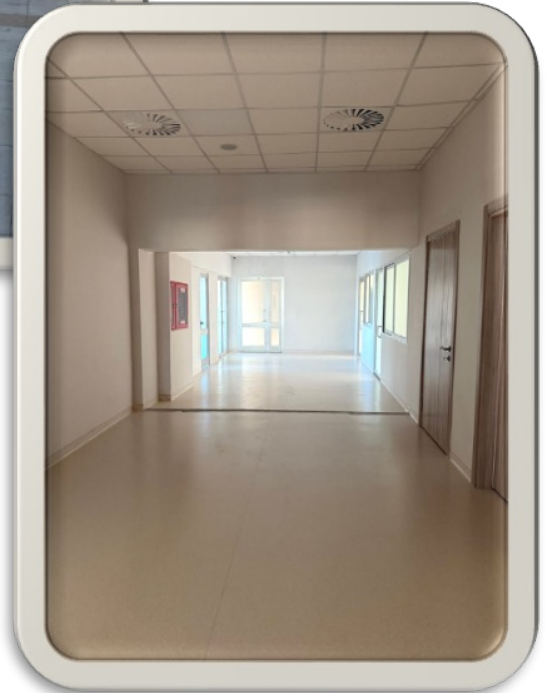

## Hemşirelik Fakültesi Klima Tesisatları Yenileme ve Islak Hacimler Onarım İşi

**Toplam Sözleşme Bedeli** : 3.259.670,40 TL

**İşe Başlama Tarihi** : 21.08.2024

**İş Bitim Tarihi** : 27.09.2024

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde klima arızaları ve yangın çıkması sonucunda binada genel bir tadilat ihtiyacı doğmuştur.

Binanın su alması sonucu çatı yalıtımı tekrar yapılmıştır.

Bir sınıfımızda asma tavan, pvc zemin, alçı-boya, alüminyum doğrama yenilenmiştir. Koridorlarda boya yapılmıştır.

Tuvaletlerde tesisatlar yenilenmiştir.

Klimaların genel bakımı, tamiratı, gerekli olan ünitelerin değişimi ve tüm klima besleme hattı yenilenmiştir.

İşin %100 ü tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.

Zemin katta yanan, EZ-03 no'lu derslikte asma tavan ve zemin PVC yenilemesi yapılmıştır. Tüm duvar ve tavan boyama işlemleri yapılmıştır. Klimalar değiştirilmiştir.





## Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Poliklinik Ek Binası İnşaatı (Plastik Cerrahi Poliklinik Binası) Yapım İşi

<b>Toplam Sözleşme Bedeli</b>	: 39.562.301,25 TL
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	: 22.12.2023
<b>İş Bitim Tarihi</b>	: 18.08.2024

- Toplam inşaat alanı zemin+1.kattan oluşmakta olup toplam inşaat alanı 1600 m<sup>2</sup>'dir.
- Dış cephede mekanik sistem ile kompakt ve 60\*120 seramik uygulaması yapıldı.
- Zeminlerde seramik ve PVC döşeme yapıldı.
- Tavanlarda asma tavan taş yünü yapıldı.
- Klima ve havalandırma yapıldı.





## Katlı Otopark İkmal İnşaatı İşi

**Toplam Sözleşme Bedeli** : 65.728.249,71 TL

**İşe Başlama Tarihi** : 07.08.2023

**İş Bitim Tarihi** : 12.07.2024

### İnşaat İmalatları:

- Çatı izolasyonu ve betonu, tuğla duvarlar, sıva ve boya ları, dış cephe sıva ve boya ları, tavan ve kolon boya ları, araç stoperleri ve kauçuk kasisler
- Seramik ve asma tavan imalatları
- Merdiven ve harpuşta mermer imalatları
- Alüminyum doğrama imalatları

### Elektrik İmalatları:


- Yağmur suyu süzgeç ve boru imalatları
- Yangın hattı demir boru imalatları
- Temiz su hattı imalatları
- Havalandırma kanalları imalatları

### Mekanik İmalatları:

- Zayıf akım kablolama imalatları
- Otopark içi aydınlatma imalatları
- Kuvvetli akım kablolama imalatları





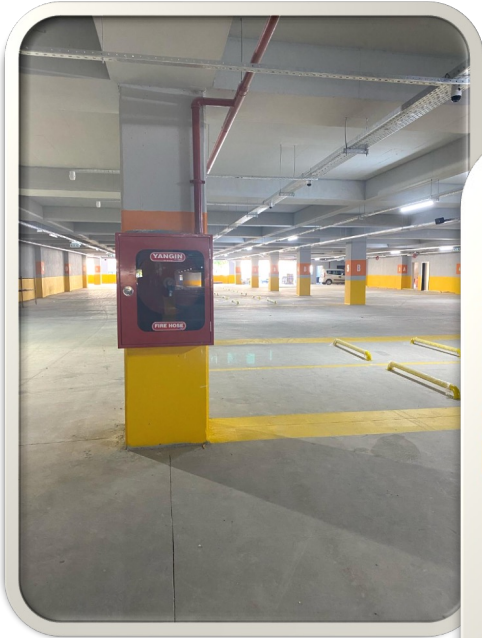



## Merkez Kampüs Binaları 1.Etap Çatı Tadilatı İşi

<b>Toplam Sözleşme Bedeli</b>	: 8.647.613,00 TL
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	: 18.12.2023
<b>İş Bitim Tarihi</b>	: 27.06.2024

Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüste bulunan eski Fakülte Binaları (Eski Mimarlık Fakültesi, Merkezi Derslikler A Blok, Fen Fakültesi A Blok) ve İdari Binaların (Merkezi Yemekhane Binası, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Binası, Meltem-Uncalı Giriş Kapıları, Çeşitli Trafo Binaları) çatılarından su aldığı için tadilat ihtiyacı doğmuştur.

Fakülte Binaların ve Merkezi Yemekhane Binası çatısında kenet çatı örtüsü sökülerek altyapısında gerekli tamiratlar yapıldıktan sonra OSB üzeri çift kat Membran yalıtım uygulaması yapılmıştır. Çatı üzerlerine Membran havalandırma bacaları konulmuştur. Baskı çıtaları yapılmıştır.

Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Binası çatısında kiremit çatı örtüsü sökülerek altyapısında gerekli tamiratlar yapıldıktan sonra OSB üzeri çift kat Membran yalıtım uygulaması yapılmıştır. Çatı üzerlerine Membran havalandırma bacaları konulmuştur. Eski PVC oluklar sökülerek yerine galvanizli boyalı sac oluk ve inişler yapılmıştır.

İş artışı kapsamında PDR Binası çatısında kenet çatı örtüsü sökülerek altyapısında gerekli tamiratlar yapıldıktan sonra OSB üzeri çift kat Membran yalıtım uygulaması yapılmıştır. Çatı üzerlerine Membran havalandırma bacaları konulmuştur. Baskı çıtaları yapılmıştır.

2 adet Betonarme Trafo Binaların ahşap çatıları sökülüp çelik çatı üzerine sandviç panel yapılmıştır. Ayrıca hastane bölgesinde 19 adet Pano ve Trafo Köşkerlerinin üzerine çelik konstrüksiyon ve sandviç panel yapılmıştır.

Fiziki olarak işin %100 ü tamamlanmıştır. Geçici Kabul yapılmıştır.









## Akdeniz Üniversitesi A-A1 Blok Zemin Kat, 1.Kat ve Tesisat Katı Tadilat ve Onarım İşi

**Toplam Sözleşme Bedeli** : 3.499.829,70 TL

**İşe Başlama Tarihi** : 04.01.2024

**İş Bitim Tarihi** : 31.05.2024

- Hastane A1 blok tesisat katında su izolasyonu yapılması
- Hastane A- A1 zemin kat ve 1. katta duvar ve tavan boyası yapılması, asma tavan imalatları
- Mescit abdest alma yerinin seramiklerinin yapılması
- Hastane A- A1 zemin kat ve 1. katta WC onarımı, seramik, kompakt bölme ve asma tavan yapılması

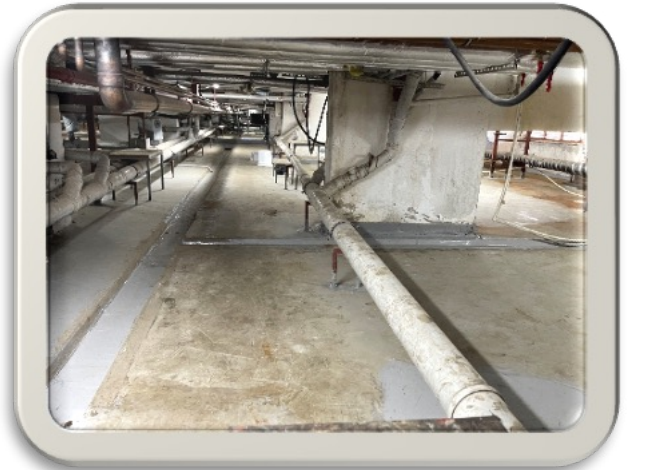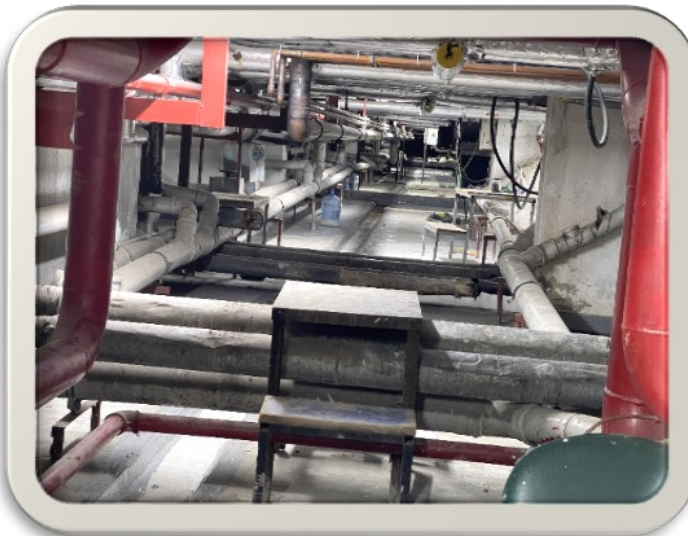

## Olbia Çarşısı 1.Etap Onarım İşi

**Toplam Sözleşme Bedeli** : 1.760.846,00 TL

**İşe Başlama Tarihi** : 25.10.2023

**İş Bitim Tarihi** : 22.05.2024

1.760.846,00 sözleşme bedelli Akdeniz Üniversitesi Olbia Çarşısı 1. Etap Onarım İşi tamamlanmış olup 22.05.2024 tarihi itibariyle Geçici Kabulü yapılmıştır. Tamamlama oranı %89,95 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu iş kapsamında çatı onarımı, WC tadilat işleri, engelli asansörü ve 2 adet sahnenin koltuk, halı yenileme ve aydınlatma işleri yapılmıştır.



## Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Radyonüklit Yataklı Tedavi Ünitesi Mekansal ve Vizyon İşi

<b>Toplam Sözleşme Bedeli</b>	: 1.976.000,00 TL
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	: 16.01.2024
<b>İş Bitim Tarihi</b>	: 15.03.2024

### Tamamlanan İnşai İmalatlar

- Mevcut duvarların yıkımı yapıldı.
- Mevcut pvc zemin kaplama sökümü yapıldı.
- Tüm kapı ve pencere demontajları yapıldı.
- Mevcut asma tavan sökümü yapıldı.
- Projeye uygun tuğla duvar imalatları yapıldı.
- Projeye uygun alçıpan duvar imalatları yapıldı.
- Tuğla duvarlara makineli alçı imalatı yapıldı.
- İhtiyaç duyulan yerlere şap imalatı yapıldı.
- Asma tavan imalatları tamamlandı.
- Tüm duvar ve tavanlara saten alçı ve anti bakteriyel boya imalatları tamamlandı.
- Islak hacimlere zemin ve duvar seramiği imalatı yapıldı.
- Zemin self leveling ve pvc döşeme kaplama imalatı yapıldı.
- Pvc kepli süpürgelik imalatı tamamlandı.,
- Projesine uygun yerlere ve uygun özelliklerde duvarlara profil iskelet üzeri kurşun kaplama imalatı tamamlandı.
- Sac kasalı Kurşun kaplı laminat kapı imalatları tamamlandı.
- Mutfak dolabı imalatı ve montajı tamamlandı.
- Dolap üzerine mermer tezgah kaplaması yapıldı.
- Alüminyum doğrama imalat ve montajları yapıldı.

### Tamamlanan Mekanik İmalatlar

- Havalandırma tesisatı demontaj işlemleri yapılmıştır.
- Vitrifiye demontajları yapılmıştır.
- Havalandırma kanal imalatları yapılmış olup klima montajları tamamlanmış ve çalışır halde teslim edilmiştir.
- Temiz su tesisatı çekilmiştir.
- Pis su tesisatı döşenmiştir.
- Islak zemin tüm vitrifiye üst montajları yapılmıştır.
- Duş teknesi montajı yapılmış ve tüm batarya ve duş başlığı seti monte edilmiştir.
- Hela taşı montajı yapılmıştır.



- Yarım ayaklı lavabo montajı yapılmıştır.
- Lavabo bataryası, sıvı sabunluk montajları tamamlanmıştır.
- Mutfak tezgahı eviye ve eviye tesisatı bağlanmıştır.
- Eviye batarya montajı yapılmıştır.
- Kanal tipi aspiratör montajları yapılmıştır. Ve çalışır halde teslim edilmiştir.

### **Tamamlanan Elektrik İmalatlar**

- Tüm demontaj işlemleri yapıldı.
- Aydınlatma ve priz linyeleri çekildi.
- Sigorta kutusu takıldı. Sonlandırmaları yapıldı.
- Armatür montajları yapıldı ve çalışır halde teslim edildi.
- Anahtar ve priz montajları yapıldı çalışır halde teslim edildi.



## 2024 YILINDA DEVAM EDEN PROJELER

### Akdeniz Üniversitesi Kampüs Altyapısı İnşaatı İşi

**Toplam Sözleşme Bedeli** : 16.987.165 TL

**İşe Başlama Tarihi** : 15.04.2024

**İş Bitim Tarihi** : 13.12.2024

#### **İhale Kapsamındaki işler tamamlanmış olup, iş Tasfiye Kabul aşamasındadır.**

- 2 Adet bayrak direği (İlahiyat Fak.)
- Olbia otoparkı sinema salonu arkası beton/parke imalatı
- Katlı otopark önü ve çevresi ve konukevi önü beton parke ve bordür imatları
- Kampüs genelinde yaya geçit çizgileri ve asfalt kasis boyalarının yapılması
- Cami ve Mimarlık Fak. otopark çizgilerinin çizilmesi
- İktisat Fak. B blok önü yağmur suyu bağlantısı ve ızgara yapılması
- Rögär ve yağmur suyu kanallarının temizlenmesi
- Kampüs içerisindeki mevcut rögarların deforme sac kapaklarının profil destekli sac kapaklarla yenilenmesi (Güzel Sanatlar Fak., Uygulamalı Bilimler Fak, Yemekhane, Turizm Fak. vs.)
- Mimarlık Fakültesinde şevli yüzeylerde çim taşı imalatı ve yağmur suyu ızgaraları yapılması, basket sahası betonu yapılması
- Rektörlük ve hastane bölgesinde çeşitli yerlere çelik stoperlerin montajının yapılması
- Olbia-Güzel Sanatlar Fak. arasındaki kaldırımda, Hemşirelik Fak. girişinde görme engelli hissedilebilir takip ve uyarı yüzeylerinin montajının yapılması, Meltem, Hukuk Fak., Kütüphane arasında kırılan görme engelli hissedilebilir takip ve uyarı yüzeylerinin tamiratının yapılması
- Hayvan Laboratuvarı ile Kök Hücre binası arasında tretuvar ve beton parke imatları
- Teknokentten güneye giden yoldan Mühendislik Fakültesine bağlanan yol üzerinde yağmur suyu ızgarası yapılması
- Sağlık Hizmetleri MYO bahçesine profil konstrüksiyon ile eğitim alanı oluşturulması
- Kampüs güney sınırındaki menfez ağzına demir profil korkuluk yapılması
- Çeşitli alanlarda kaldırımlarda engelli rampaları yapılması
- BESYO, Meltem ve Uncalı Kapılarında boru korkuluk yapılması
- Olbia İş Bankası önünden Amfi tiyatroya doğru yağmur suyu drenaj hattı yapılması, Olbia Amfi tiyatro merdiven girişine sahanlık betonu dökülmesi
- Yemekhanenin pis su hattının atölyelerin kuzeyindeki ana rögara kadar yenilenmesi
- Hastane, Fen Fak., Olbia, Turizm Fak. bahçesinde zerezemin sondaj ve rögarı yapılması
- Kampüs çevresinde çeşitli yerlerde jiletli tel imalatı yapılması
- Fen Fak. ve Kütüphane yürüme yolu kırık travertenlerinin yenilenmesi,
- Yabancı Diller Y. O. kaldırım ve traverten döşeme kaplaması

Uncalı kapısı girişi güney bekleme alanı içerisinde toplanan yağmur suyunun drenajının yapılması





## Akdeniz Üniversitesi Kampüs Elektrik Altyapı İşi

<b>Toplam Sözleşme Bedeli</b>	: 15.027.530 TL
<b>İşe Başlama Tarihi</b>	: 05.07.2024
<b>İş Bitim Tarihi</b>	: 16.12.2024

### **İhale Kapsamındaki işler tamamlanmış olup, iş geçici kabul aşamasındadır.**

- Kapalı otopark çevresindeki aydınlatma direkleri ve sodyum buharlı aydınlatma armatürleri demonte edildi.
- Trafo merkezlerindeki arızalı 24V bakımsız akü redresörler değiştirildi.
- B Blok trafo, hücre ve ana pano odalarında aerosol gazlı söndürme sistemi yapıldı.
- Kapalı otopark çatısına 2 adet aktif paratoner imalatı yapıldı.
- Uncalı yolu aydınlatma direkleri için topraklama imalatı yapıldı.
- TR5 trafo merkezi içerisindeki jeneratör transfer panoları değiştirildi ve jeneratörlerin senkron çalışması için senkron pano uygulaması yapıldı.
- Ziraat Fakültesi hayvan çiftliğine 2 adet box pano ve kablo altyapısı yapıldı.
- TR1 trafo merkezi ana panosu yenilendi.
- TR1 trafo merkezi ile A2 blok trafo merkezi arasında kablolama yapılarak TR1 trafo merkezindeki ana panonun A2 bloktan beslenmesi sağlandı. TR1 trafosu iptal edildi.
- Arızalı durumdaki Edebiyat Fakültesi orta gerilim hücreleri yenileriyle değiştirildi.
- Acil girişine 25 metrelik asansörlü projektör direği montajlandı.
- Mühendislik Fakültesi trafo - jeneratör arasına transfer panosu imalatı yapıldı.
- Rampaaltı tıbbi gaz panosu yenilendi.
- Hastane kuzey çıkışı güvenlik kulübeleri elektrik altyapısı yapıldı.
- Rektörlük binası önü Turizm Fakültesi bahçesi ve Olbia Çarşısı bahçesine galvaniz direkler ile aydınlatma imalatı yapıldı.
- Kreş binası orta gerilim hattı için dere yatağı üzerinde köprü yapılarak kablolar askıya alındı.
- Radyasyon onkoloji binası için 1100kVA dizel jeneratör, transfer panosu ve altyapı kablolama imatları yapıldı.



## Akdeniz Üniversitesi Yeni Konservatuar (Merkezi Derslik B-Blok) Binası Onarım ve Tadilat İnşaatı İşi

**Toplam Sözleşme Bedeli** : 4.436.394,17 TL

**İşe Başlama Tarihi** : 28.12.2023

**İş Bitim Tarihi** : 31.05.2024

**İhale Kapsamındaki işler tamamlanmış olup, iş geçici kabul aşamasındadır.**

- Akustik alçı levhalarla 683,21 m<sup>2</sup> bölme duvarlar yapıldı.
- Taş yünü asma tavan yapıldı. 107,54 m<sup>2</sup>
- 20 adet laminat kaplamalı ahşap kapı yapıldı.
- 36,79 m<sup>2</sup> kapı kanadı yapıldı.
- Kapılara kol, kilit ve menteşe takıldı.
- Kırık camlar değiştirildi.
- Duvarlarda 683,21 m<sup>2</sup> taş yünü ile ses yalıtımı yapıldı.
- Bale sınıflarının zemini 208,04 m<sup>2</sup> pvc esaslı bale muşambası ile kaplandı.
- Konferans salonu kapısına suni deri ile kapitone kaplama yapıldı.
- Öğretim üyeleri odaları, büro ve sınıflarda 903,13 m<sup>2</sup> laminat kaplama yapıldı.
- Mevcut taş yünü asma tavanda 90 m<sup>2</sup> kırık ve kirli plakalar değiştirildi.
- Tiyatro ve konferans salonu sahnelerine 67,569 m<sup>2</sup> ahşap parke yapıldı.
- Tiyatro ve konferans salonu için metal konstrüksiyon ile sahne yapıldı.
- Bale ve tiyatro salonlarına 334,35 m<sup>2</sup> kadronlu doğal ahşap döşeme kaplaması yapıldı.
- Doğal ahşap döşemelere su bazlı ahşap koruyucu, cila ve macun çekildi.
- Bale salonlarına 25,80 adet bale barı yapıldı.
- Bale salonlarının duvarlarına 133,207 m<sup>2</sup> ayna takıldı.
- Piyano odalarına 476,218 m<sup>2</sup> yumurta süngerden ses yalıtımı yapıldı.
- Sınıflar, koridorlar, ofisler ve öğretim üyeleri odaları su bazlı boya ile boyandı. 5307,62 m<sup>2</sup>



**Akdeniz Üniversitesi İleri Sağlık Araştırmaları Merkezi (Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Binası) İkmal İnşaatı İşi**

**Toplam Sözleşme Bedeli** : 102.251.379 TL

**İşe Başlama Tarihi** : 18.01.2024

**İş Bitim Tarihi** : 19.12.2024

**İhale Kapsamındaki işler tamamlanmış olup, iş geçici kabul aşamasındadır.**

**Tamamlanan İnşai İmalatlar**

- Her türlü pvc, alm vb. kapı, doğrama söküm işleri tamamlandı.
- Bina geneli tüm asma tavan söküm işleri tamamlandı.
- Duvar yıkım işleri tamamlandı. Uygulama projesine göre yeni duvar imalatları tamamlandı. (20 cm hatıl ile)
- Zemin kat epoksi döşeme silinmesi ve şap kırımı işleri tamamlandı.
- Çelik güçlendirme imalatları tamamlandı.
- Çelik güçlendirme için kırılan şap'ların tamiratları yapıldı. Teraslarda bulunan alanlara izolasyon yapıp karo tamiratları yapılarak sonlandı.
- Yeni shaft boşlukları için beton kesimi imalatları tamamlandı.
- Tüm güçlendirme perdelerinin beton döküm imalatları tamamlandı.
- Betonarme yüzeylere alçı sıvaya hazırlık için astar uygulaması tamamlandı.
- Yeni örülen tüm tuğla duvarların ve güçlendirme perdelerinin makineli alçı imalatı tamamlandı.
- Zemin kat wc alanı duvar seramikleri söküldü.
- Islak hacimlerin duvarlarına çimento esaslı kara sıva uygulaması tamamlandı.
- Zemin kat şap imalatı tamamlandı.
- Tüm duvar seramik imalatları tamamlandı.
- 2. kat ofis bölgesi ve zemin kat alçıpan duvar imalatları tamamlandı.
- 1. kat temiz oda paneli arkasında kalan doğramalara alçıpan kapama imalatı tamamlandı. (dıştan sıvaları dahil)
- 1. ve 2. kat alçıpan asma tavan imalatları tamamlandı. Zemin katta imalat devam ediyor.
- 2. kat duvar ve tavan saten alçı imalatları tamamlandı.
- 1. kat saten alçı imalatları tamamlandı
- Çatı katı makine dairesi zeminine 2 kat sürme su izolasyonu yapıldı.
- Makine dairesi Şap imalatı tamamlandı
- Makine dairesi mermer döşeme kaplaması imalatı tamamlandı.
- Çatı katı medikal gaz alanı için teras karo sökümü yapıldı. Zemin yükseltme için beton dökümü yapıldı.
- Medikal gaz alanı projesine uygun şekilde karkas imalatları tamamlanıp boardex vidalama uygulaması yapıldı. (kara sıva dahil)
- Medikal gaz alanı çatı sandviç panel montaj imalatı tamamlandı.
- Medikal gaz alanı zemin 60\*60 parlak porselen karo döşeme imalatı tamamlandı.
- 1. kat açılır kapanır çatı sistemi (pergole) için teras karo sökümü yapıldı. Zemin yükseltme için beton dökümü yapıldı.



- Pergole alanı zemin 60\*60 mat porselen karo döşeme imalatı tamamlandı.
- Açılır kapanır çatı sistemi ve katlanır cam montajı imalatı tamamlandı.
- 2. kat müdür orası teras çıkış alüminyum doğrama, kol hariç tüm madeni aksamlar ve cam montajı tamamlandı.
- Zemin kat alüminyum kapılar ve alüminyum doğramalar için kör kasa imatları yapıldı.
- Zemin 1 ve 2. kat 20 adet kapının sac kasa montajları tamamlandı.
- Klima santralleri altı 100\*100\*4 mm profil kaide imatları tamamlandı. Epoksi boya imatları tamamlandı.
- VRF dış ünite altı 60\*80\*3 mm profil kaide imatları tamamlandı. Epoksi boya işleri tamamlandı.
- Yangın suyu deposu binası için yumuşak kazı işleri yapıldı.
- Yangın suyu deposu binası Temel kalıp demir ve beton (yüzey sertleştirici ile) imatları tamamlandı.
- HDPE boru döşeme için asfalt kesimi ve kazı imatları tamamlandı.
- Alüminyum kapı montajları tamamlandı.
- Zemin kat saten alçı imalatı tamamlandı.
- Tüm döşeme seramik imatları tamamlandı.
- Asansör mermer söve kaplaması tamamlandı.
- Otomatik kapı montajları tamamlandı.
- Tüm katlar asma tavan imatları tamamlandı.
- 1. kat demiz oda duvar paneli imatları tamamlandı.
- Laboratuvar bölümü tavan paneli montajları tamamlandı.
- 2. kat boya imatları tamamlandı.
- Laminat kanat kapı montajları yapıldı.
- Wc akrilik tezgah ve lavabo montajları tamamlandı.
- Wc kompakt laminat kabin montajları tamamlandı.
- 2. kat pvc zemin imatları tamamlandı
- 1. kat teras paslanmaz çelik korkuluk ve cam montajları tamamlandı.
- 7 adet shaft kapağı montajı yapıldı.
- Laboratuvar tarafı tezgah karkas montajları tamamlandı.
- Soyunma dolapları sahaya indirildi.
- Zemin kat tüm duvar geçişlerinde sızdırmazlık sağlamak amacıyla izolasyon imatları yapılıyor.
- Zemin kat asma tavan alçıpan kapama tamamlandı.
- Zemin kat duvar saten alçı imalatı sonlandı, tavan saten alçı imalatı tamamlandı.
- Zemin kat tavan ve duvar boya imalatına devam ediliyor.
- Zemin kat self leveling ve pvc zemin imalatı devam ediyor.
- Zemin kat tezgah karkas montajları tamamlandı.
- Tezgah dolapları montajı tamamlandı.
- Zemin kat alüminyum kapı imalatı ve montajı tamamlandı.
- Teraslarda bulunan havalandırma kanalı çıkışlarına profil+boardex kapama imalatı yapılmıştır. Sıva imatları tamamlanmıştır.
- Cephe pis su çıkışlarının rögarlara bağlantısı üzeri dolgu ve beton işleri tamamlandı.

- BSL2-3 temiz oda tavan paneli montajı tamamlandı.
- Kompakt laminat tezgah montajı tamamlandı.
- Arka cephe tretuvar yükseltme imalatı tamamlandı.
- Cephe rögar bağlantıları tuğla duvar imalatları ile gizlemesi yapıldı.
- 1. kat bsl tarafı pvc zemin imalatları tamamlandı.
- Şaft boşlukları sızdırmazlık imalatları tamamlandı.
- Yangın depo binası çelik imalatları tamamlandı.
- Yangın depo binası cephe panjur imalatları ve montajları tamamlandı.
- Yangın depo binası cephe betopan kapama imalatları ve sıva işleri tamamlandı.
- Yangın depo binası çatı boardex+taşyünü+trapez sac kapama imalatları tamamlandı.
- 2. kat alüminyum süpürgelik montajları tamamlandı.
- Akriik tezgah montajları tamamlandı.
- Merdiven boşlukları boya imalatları tamamlandı.
- Tavan saten alçı ve boya imalatları tamamlandı.
- Gaz sızdırmaz kapı ve Gaz sızdırmaz passbox montajları tamamlandı.

### **Tamamlanan Mekanik İmalatlar**

- Tüm mekanik tesisat de-montajlar tamamlandı. Sökümü yapılan malzemeler idarenin istediği yerlere teslim edildi.
- 2. kat sıhhi tesisat, WC Sıhhi tesisat işleri tamamlandı
- 1. kat sıhhi tesisat, WC Sıhhi tesisat işleri tamamlandı
- Zemin kat sıhhi tesisat, WC Sıhhi tesisat işleri tamamlandı
- Zemin kat PVC tesisatları tamamlandı.
- Zemin kat PPRC Tesisatı tamamlandı.
- 1. kat PVC tesisatları tamamlandı.
- 1. kat PPRC Tesisatı tamamlandı.
- 2. kat PVC tesisatları tamamlandı.
- 2. kat PPRC Tesisatı tamamlandı.
- Çatı kat PVC tesisatları tamamlandı.
- Çatı kat PPRC Tesisatı tamamlandı.
- Yangın tesisatı (Gazlı söndürme hariç) tamamlandı testler yapıldı sprink montajlar tamamlandı
- 2. kat havalandırma ana hat kanalları ve izolasyonları tamamlandı
- 1. kat havalandırma ana hat kanalları ve izolasyonları tamamlandı
- Zemin Kat havalandırma ana hat kanalları ve izolasyonları tamamlandı
- Medikal tesisat tamamlandı.
- Basınçlı hava santrali, vakum santrali, Oksijen, argon, helyum, hidrojen, karbondioksit, kuru hava, nitrojen santralleri ve tüplerin montajları tamamlandı.
- Su depoları montajları tamamlandı
- Tüm VRF ve Klima santralleri montajı tamamlandı. Klima Santrali ve DX VRF dış ünite ve Ahu kit yerleşimleri yapıldı.
- Tüm HVAC tesisatı tamamlandı. Egzost fan montajları tamamlandı.
- HVAC kanallarında sızdırmazlık testleri akredite belgeli firma tarafından yapıldı.

- Klima Santralleri montajları tamamlandı.
- Bekçi filtre montajları tamamlandı.
- Gazlı söndürme tesisatı tamamlandı.
- Soğuk oda montajı tamamlandı.
- Yangın pompası ve kullanım suyu hidrofor montajları tamamlandı
- Çatı makine dairesi tüm ekipman montajları tamamlandı devreye almaya hazır hale getirildi.
- Tüm Havalandırma ekipmanları montajı tamamlandı
- Vitriyeller montajları tamamlandı
- Çeker Ocaklar montajları tamamlandı.
- Motorlu Tip Bubble Tight İzolasyon Damperi 5 adet BSL 3 deki yerine takıldı
- Klima santrali round around tesisat bağlantıları ve Nemlendirme cihazı bağlantıları tamamlandı.
- Kanal saç kaplama işleri tamamlandı.

### **Tamamlanan Elektrik İmalatlar**

- Trafo, hücreler ve beton köşk montajı yapıldı ve devreye alındı.
- Jeneratör yerine yerleştirildi devreye alındı
- UPS yerine yerleştirildi devreye alındı
- OG kazısı tamamlandı, kablolama imalatı yapıldı ve devreye alındı.
- 1. kat tava imalatları tamamlandı.
- 2. kat tava imalatları tamamlandı.
- Boş boru imalatları tamamlandı.
- 2. kat sorti ve linyeler tamamlandı.
- Zemin kat sorti ve linje kablolama imalatları tamamlandı.
- Ana panolar ve UPS panosu yerine yerleştirildi devreye alındı
- Pano besleme kabloları çekildi bağlantıları tamamlandı
- 2. kat zayıf akım kabloları çekildi.
- 1.kat linje ve sorti kablolama tamamlandı.
- 1.kat zayıf akım ve otomasyon kablolama imalatı tamamlandı.
- Gazlı söndürme sistemi zemin kat ve 1. kat imalatları tamamlandı.
- Zemin kat 1.Kat ve 2.Kat Zayıf akım ve otomasyon kablolama imalatı tamamlandı.
- Tün pano bağlantıları tamamlandı
- Armatür montajları BSL2-3 tarafı hariç tamamlandı
- Laboratuvar tezgahları led armatür BSL2-3 tarafı hariç tamamlandı
- Otomasyon sensör montajları BSL2-3 tarafı hariç tamamlandı
- Asansör Montajı Tamamlandı ve devreye alındı
- Klima santralleri kablolama ve bağlantılarına devam edildi.
- Anahtar Priz Montajı BSL2-3 tarafı hariç tamamlandı devreye alındı
- Çevre aydınlatma imalatları tamamlandı.
- Tv ve data prizleri kabin tarafı montaj sonlaması Tamamlandı
- Kamera ve ses sistemi montajı tamamlandı Devreye Alındı





## ÖNERİLER

- Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken, kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması.
- Yatırım ödeneklerinin ilk altı aylık dönemde serbest bırakılması.
